#### 議案第63号

#### 灘黒岩水仙郷外構整備工事請負変更契約の締結について

南あわじ市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年南あわじ市条例第46号)第2条の規定に基づき、先に議会の議 決に付し、工事請負契約を締結した灘黒岩水仙郷外構整備工事について、特例 措置による労務単価スライドの金額変更、水仙球根植付の追加及び残土処分量 の変更を行いたいので、下記のとおり請負変更契約を締結するため、地方自治 法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議 決を求める。

令和5年8月30日提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

記

- 1 契約の目的
- 2 変 更 契 約 金 額 (現契約金額
- 3 今回変更による増額
- 4 契約の相手方

灘黒岩水仙郷外構整備工事

388, 386, 900円

352,000,000円)

36,386,900円

入谷緑化土木株式会社

代表取締役 入谷 芳郎

## 灘黒岩水仙郷外構整備工事変更概要書

#### 1. 変更内容

特例措置による労務単価期を令和4年3月1日から令和5年3月1日に単価スライドするための増額変更を行います。


また、リニューアルオープンに向け、近年の水仙開花状況が芳しくない状態について検討を行った結果、球根の植付を追加するとともに、オープン中に臨時駐車場として使用することとなった倉川駐車場の仮置き残土を処分するため、残土処分費を変更することにより増額となります。


加えて、新築施設の建築工事との調整により完成時期を令和5年9月30日から 令和5年12月8日までに延長することによる変更です。

#### 2. 変更概要

	当初		変更後		
電気設備工事	変更なし				
機械設備工事	変更なし				
土木工事	1. 0式	$\Rightarrow$	1. 0 =	弋	
(植栽工	_	$\Rightarrow$	1. 07	弌) 追加	
(残土処分	_	$\Rightarrow$	1. 0 =	弌) 追加	
外構	1. 0式	$\Rightarrow$	1. 0 =	弋	
園路	1. 0式	$\Rightarrow$	1. 07	弌	

# 位置図

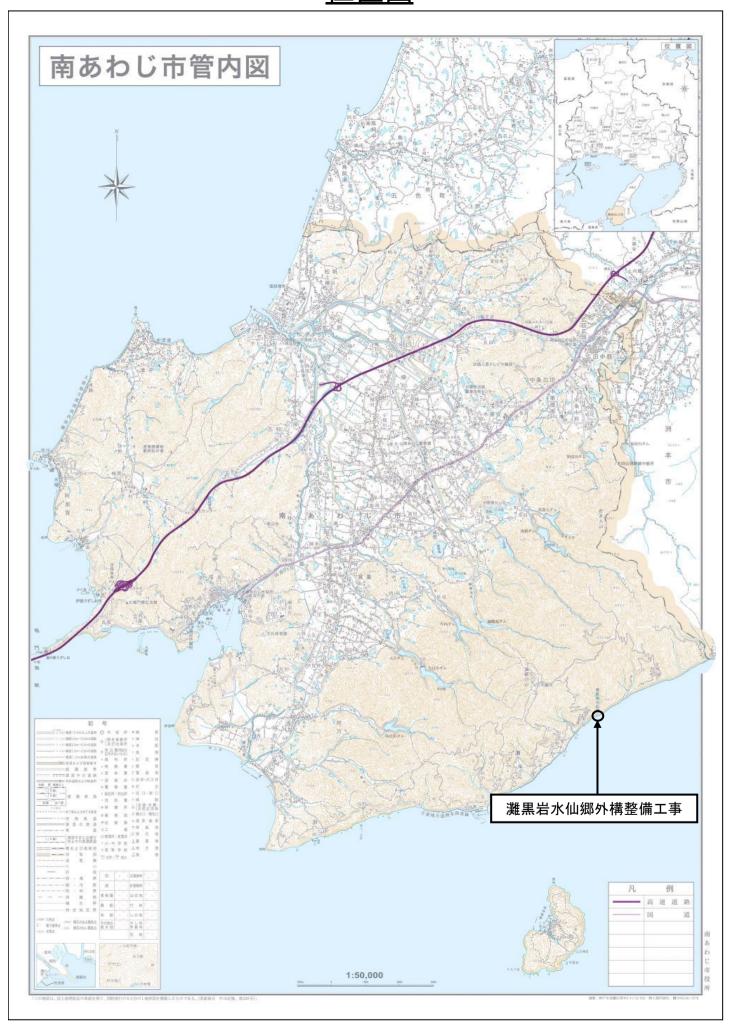

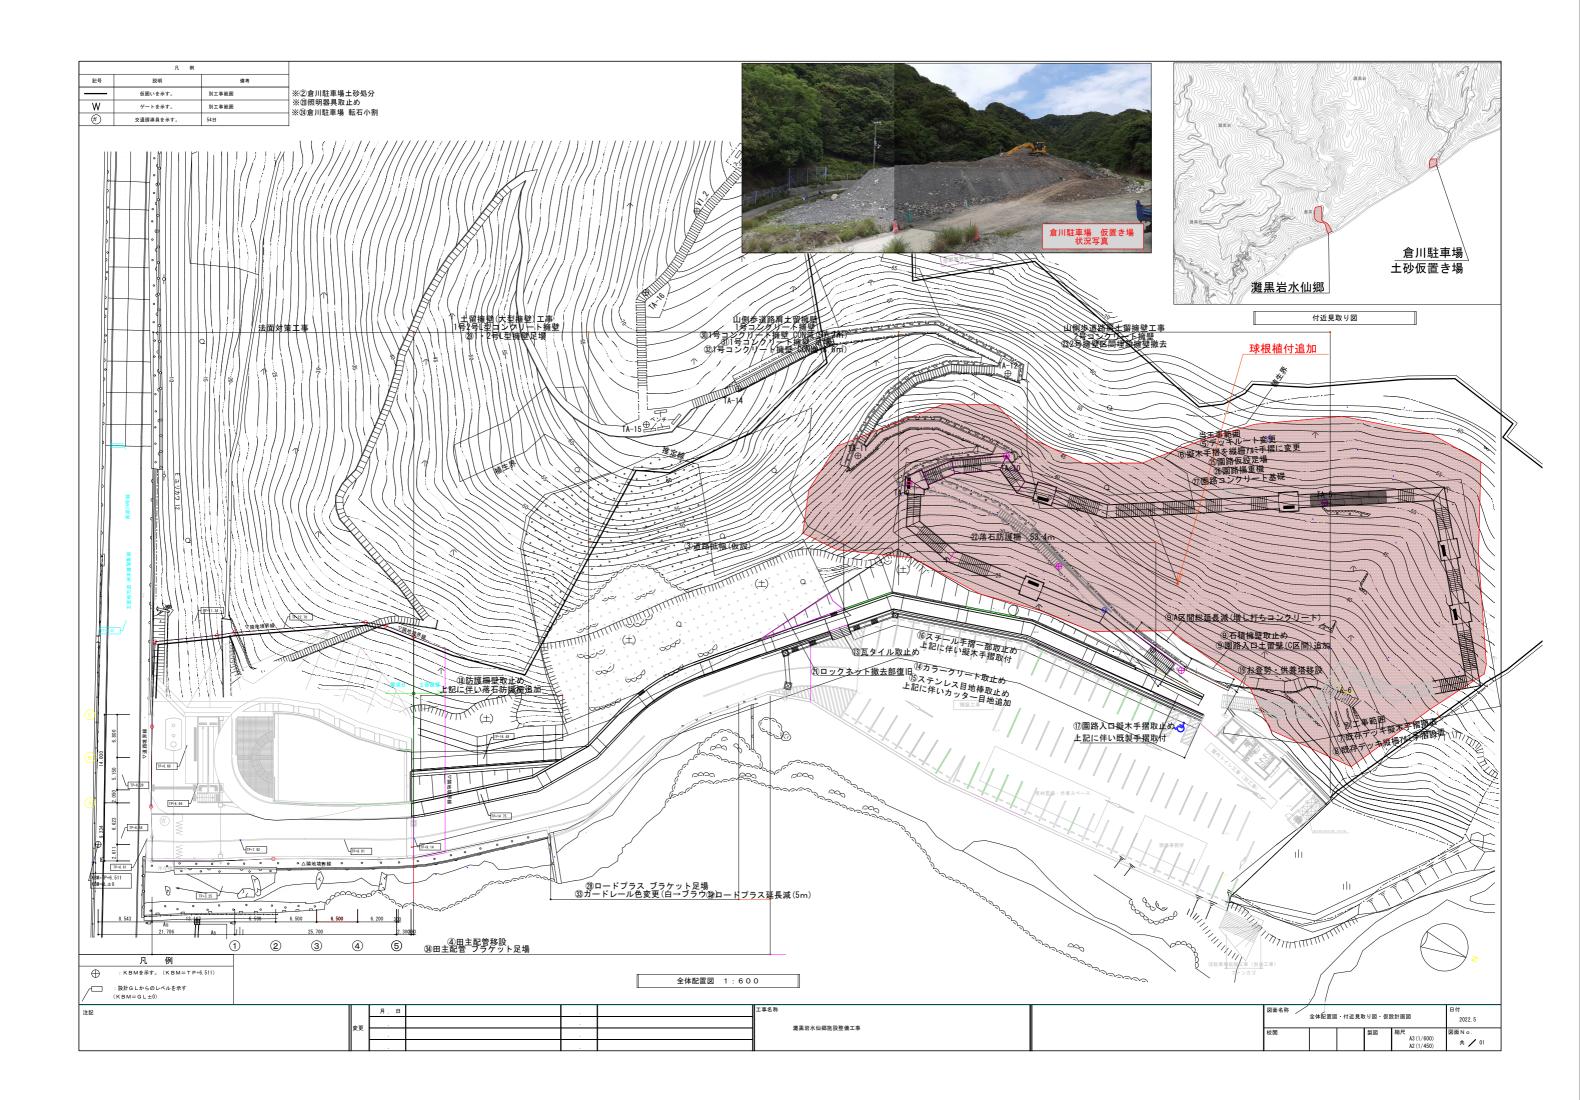

#### 議案第64号

道の駅うずしおリニューアル工事請負変更契約の締結について

南あわじ市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年南あわじ市条例第46号)第2条の規定に基づき、先に議会の議 決に付し、工事請負契約を締結した道の駅うずしおリニューアル工事について、 特例措置による労務単価スライドの金額変更、既設建物解体時に遺構が発見さ れたことによる遺構撤去作業の追加及び新設施設の基礎形状の変更を行いたい ので、下記のとおり請負変更契約を締結するため、地方自治法(昭和22年法 律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求める。

令和5年8月30日提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

記

- 1 契約の目的
- 2 変 更 契 約 金 額 (現契約金額
- 3 今回変更による増額
- 4 契約の相手方

道の駅うずしおリニューアル工事

- 1, 475, 378, 300円
- 1, 353, 000, 000円)

122, 378, 300円

株式会社森長組

代表取締役 森 宏文

### 議案第64号資料

### 道の駅うずしおリニューアル工事変更概要書

#### 1. 変更内容

特例措置による労務単価期を令和4年3月1日から令和5年3月1日に単価スライドするための増額変更を行います。

また、既設建物解体時に遺構が発見されたため、遺構撤去作業の追加及び新設施設の基礎形状の変更を行い、それに伴い完成時期を令和6年9月19日から令和7年2月28日までに延長することにより増額となる変更です。

#### 2. 変更概要

	当初		変更後			
【建築工事】						
拠点施設等	1. 0式	$\Rightarrow$	1.	0式		
(遺構解体撤去	_	$\Rightarrow$	1.	0式)追加		
(柱状改良・土留	_	$\Rightarrow$	1.	0式)追加		
(発生材処分	_	$\Rightarrow$	1.	0式)追加		
バス待合・駐車場上屋		変更なし				
【土木工事】						
外構工事		変更なし				
新設駐車場	変更なし					
ターミナル広場		変更なし				
既設歩道改良工事		変更なし				

# 位置図

